


Viivytyskaivon ylivuoto purkureitin ojien kaadot.

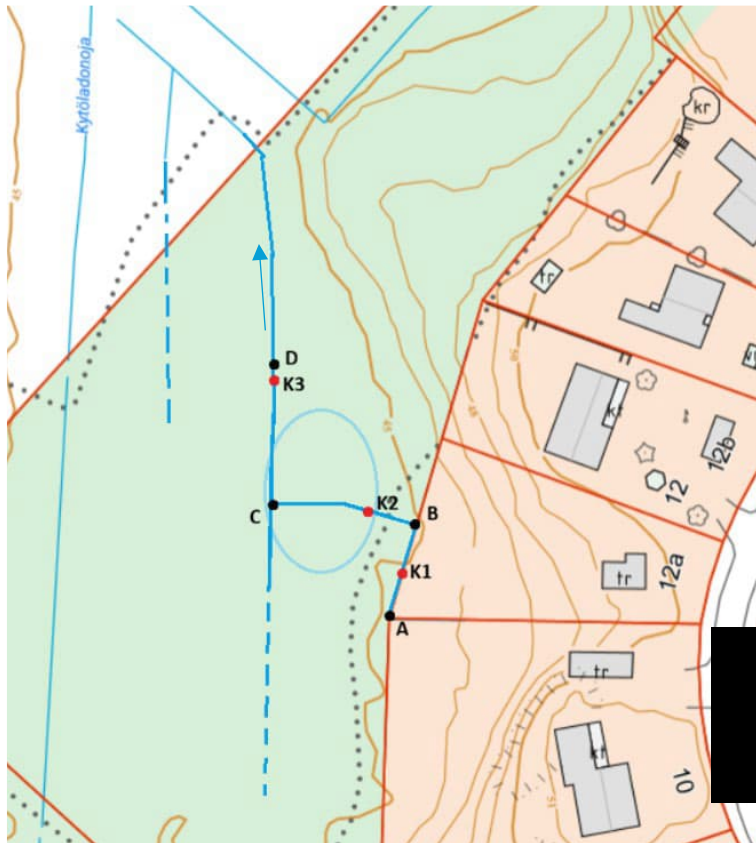

A-B n. 17 metriä, kaatoa 0,15m

B-C n. 30,5m, kaatoa 0,38m. Pisteiden K2 ja C väli hieman soistuvaa eikä yksittäistä selkeää pääojaa/uomaa ollut vaan veden kulku jakaantui laajemmalle alueelle kohti C-D suuntaista ojaa.

C-D n. 20m, kaatoa 0,25m.

A-D pisteiden yhteenlaskettu kaato 0,78m.



A.piste.



K1.



B.piste.



K2.



K3.
